

Orden vigente hasta el 30/06/2024 para presentar con su firma en Oficialia Mayor.

Sírvase surtir lo siguiente para:

3076 FISM

30762317057250101 ESTIMACIÓN 2317057 CONSTRUCCIÓN DE 18  
CUARTOS DIGNOS, CD. CUAUH.

640 GRUPO VALANT, S.A.S. DE C.V.



SAACGNet

0

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

2508 Comprometido FISM 2023

Orden de Compra

Folio: 001820

Captura

16/03/2024 15:03:00

COPIA

11613

0

Cantidad	Unidad	Articulo	P. Unitario	Total
1.00	Pieza	Estimación No. 7 Tipo "C"	\$109,788.39	\$109,788.39

Estimación No. 7 Tipo "C" Contrato MC-2317057-057-BIS-LP-2023

TOTAL:

\$109,788.39

**AUTORIZADO**

16/03/2024 ??:??

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUHTÉMOC  
RECURSOS MATERIALES

Por el departamento de Recursos Materiales  
LIC. HEIDI PRISCILA ORTIZ-URIBE

\*30761820\*

**RECIBIDO**

9:00 am  
22 MAR 2024

RECURSOS MATERIALES  
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

Orden vigente hasta el 30/06/2024 para presentar con su firma en Oficialía Mayor.



SAACGNet

Sírvase surtir lo siguiente para:

**3076 FISM**

**307623170570026 RETENCIONES CICAC 1% 2317057 CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS, CD. CUAUH.**

**391 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS D**

2508 Comprometido FISM 2023

**Orden de Compra**

Folio: **001821**

**Captura**

16/03/2024 15:03:00

**COPIA**

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

0

Cantidad	Unidad	Artículo	P. Unitario	Total
1.00	Pieza	Retención CICAC 0.1%	\$94.89	\$94.89

Retención CICAC 0.1% Estimación No. 7 Tipo "C" Contrato MC-2317057-057-BIS-LP-2023

TOTAL:

\$94.89

  
\*30761821\*

  
Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

**AUTORIZADO**

16/03/2024 ??:??

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUHTÉMOC  
RECURSOS MATERIALES

  
Por el departamento de Recursos Materiales  
LIC. HEIDI PRISCILA ORTIZ-URIBE

**RECIBIDO**

22 MAR 2024

09:00

RECURSOS MATERIALES  
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

Orden vigente hasta el 30/06/2024 para presentar con su firma en Oficialia Mayor.



SAACGNet

**Sírvase surtir lo siguiente para:**  
**3076 FISM**

307623170570027 RETENCIONES DIF 2% 2317057 CONSTRUCCIÓN DE  
18 CUARTOS DIGNOS, CD. CUAUH.

**390 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA**

2508 Comprometido FISM 2023

**Orden de Compra**

Folio: **001822**

Captura

16/03/2024 15:03:00

**COPIA**

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

0

Cantidad	Unidad	Artículo	P. Unitario	Total
1.00	Pieza	Retención DIF 0.2%	\$189.78	\$189.78

Retención DIF 0.2% Estimación No. 7 Tipo "C" Contrato MC-2317057-057-BIS-LP-2023

TOTAL:

\$189.78

\*30761822\*

**AUTORIZADO**  
16/03/2024 ??:??

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUHTÉMOC  
RECURSOS MATERIALES

Por el departamento de Recursos Materiales  
LIC. HEIDI PRISCILA ORTIZ-URIBE

**RECIBIDO**

22 MAR 2024  
09:00  
RECURSOS MATERIALES  
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC



Usr: GUBEROBRAS2  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: P08477 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024  
11:30 a. m.  
Página | 1

Concepto: F 41 - Obra Pública : 2317057 - Construcción 18 cuartos dignos Contrato : 61. GD Folio: 1682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$90,074.15		FF:2508, GD Folio: 1682
0002	8250-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$19,998.91		FF:2508, GD Folio: 1682
0003	8240-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$90,074.15	FF:2508, GD Folio: 1682
0004	8240-2508-2K0106-3071-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$19,998.91	FF:2508, GD Folio: 1682
0005	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$90,074.15		FF:2508, GD Folio: 1682
0006	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$19,998.91		FF:2508, GD Folio: 1682
0007	2113-002126	GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V.		\$90,074.15	FF:2508, GD Folio: 1682
0008	2113-002126	GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V.		\$19,998.91	FF:2508, GD Folio: 1682
Sumas iguales =>			220,146.12	220,146.12	

*Oscar Contreras*



Folio: 342

Factura / Referencia: F 41

Fecha: 20/03/2024

Status: Activo

Aceptar

Obra Publica: 2317057 - Construcción 18 cuartos dignos

Comentarios: 2317057 Estimación No. 7 Tipo "C" Contrato MC-2317057-057-BIS-LP-2023

Orden	Concepto Id	Concepto	Importe Contratado	Avance Acumulado	% Acumulado	Importe Avance	% Avance	Comentarios
1	27	CONSTRUCCION DE CUARTOS	355.157,43	245.083,28	69.01	110.073,06	30.99	2317057 Est. 7-C

Oscar Castro

Importe total del Avance: 110.073.06

Porcentaje Avance: 30.99 %





## Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Folio Fiscal: fea4d5c2-35f8-4068-8cbd-e1bc15914e3f  
Fecha de Expedición: 2024-03-19T08:33:48  
Lugar de Expedición: 31207 Exportación: No aplica  
Cert CSD: 00001000000508792645  
Folio interno: F 41

### Datos del Emisor

GRUPO VALANT  
RFC  
GVA2010149V3  
DOMICILIO FISCAL  
CEBU 7222 Col. AVICOLA, C.P. 31207, CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
RÉGIMEN FISCAL  
626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del Receptor

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
USO CFDI  
G03 - Gastos en general  
RFC  
MCU270101TK7  
DOMICILIO FISCAL  
Av. Allende 15 Col. Ciudad Cuauhtémoc Centro, C.P. 31500, CUAUHTÉMOC, Cuauhtémoc, Chihuahua, MEX  
RÉGIMEN FISCAL  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
E48/Unidad de servicio	72101500	1.000	TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. ESTIMACION NUMERO 7 (SIETE) TIPO C SEGUN CONTRATO NUM. MC-2317057-057-BIS-LP-2023 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$94,890.57 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO C.I.C.A.C. DEL 0.1% \$94.89 SIS. DES. INT. FAM. MUN. CUAU. DEL 0.2% \$189.78 NETO A RECIBIR \$109,788.39	\$ 94,890.57	\$ 94,890.57

Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL: \$ 94,890.57  
+ IVA (16%): \$ 15,182.49  
TOTAL: \$ 110,073.06

Ciento diez mil setenta y tres pesos 06/100 M.N.  
Forma de Pago: 99 - Por definir  
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN

### CFDI's Relacionados:

T. Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo  
UUID's: bbfbbba9e-6a0e-4faf-9259-da9f3367176e  
Fecha de Certificación: 2024-03-19T08:33:48

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|fea4d5c2-35f8-4068-8cbd-e1bc15914e3f|2024-03-19T08:33:48|LSO1306189R5|m9RA37y3KBy7BcE3YudZ1kfutV/geP321MvNsvNfxI5XPJmYFQcJlI3SjRrIbfv  
s4Prb16HfLHaFAq+I3oPRzoHKTcmLz7PcnmaUOSqUP6/RUV9FFhpYtbayCTaAaHHkPugU4O7RRNKEcZl/Nv2U/PdGI7RH8nrZlqHKXLzSMLYg9eexwAvJOxz1a  
+JbMlqeZ++SID9eUq+nYOSymUI5mVvN3WQAT6EmgWEKuWOWWssv1thw4FD8wjRcK5nTW+pQ7QILwPgIZB6ewIDHorLWruMMeT+G2owJlsMJ8gxtsOc3W0X  
VRdL18bwENUxHTovw2Zzmnd6Fbkadn5g=||00001000000509846663||

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

m9RA37y3KBy7BcE3YudZ1kfutV/geP321MvNsvNfxI5XPJmYFQcJlI3SjRrIbfv4Prb16HfLHaFAq+I3oPRzoHKTcmLz7PcnmaUOSqUP6/RUV9FFhpYtbayCTaAaH

factura.com



HikPugU4O7RRNKEcZiNv2U/PdGi7RH8nrZlqHKXLfzSMLYg9eexwAvJOxz1a+JbMikqeZ++SID9eUq+nYO5ymUI5mVn3WQAT6EmgWEKuWrOWssv11hw4FD8wj  
RcK5nTW+pQ7QILwPgIZB6ewtIDHorLWruMMeT+G2owJlsMJu8gxtsOc3W0XVRdL18bwENUxHTovw2ZzmnD6Fbkadn5g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PTSgg3AbMIJcTQIIIMmb8xQ7RgcjB+FBp2osEmVCCjo7wxc7I4yofrxPE70FgegGO3Ukvp6qGyWlunfxb2IAYZz83mT8XTqj76vAEX11chWkMP4zEhuhLD9TrjgV  
SkbK9bKYCAunnUJhjO/GPJ9sl18p45JNPSbN9UejuPhnvZm9LAcnDcQQDk++seDITmrbaUNE6P8x4FYyaDAaQLwuaJuPACOWOYyY+gqWkJM+isouYIbU4Vm3vku  
KzDMk4vYyOChf5dGt3Js04nM/wad8T/jtGO3gmNN19CHjF8NIBcuZglaYt1/ihwPGG3hFx6ihcHHsUi6Lu8oBRilQ==  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVA2010149V3	GRUPO VALANT	MCU270101TK7	MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEA4D5C2-35F8-4068-8CBD-E1BC15914E3F	2024-03-19T08:33:48	2024-03-19T08:33:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110,073.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE ENERO DEL 2024

**CONTROL PRESUPUESTAL**

ANEXO ESTIMACION No. IETE) TIF CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :  
**CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.**

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 11 ENERO AL 27 DE ENERO 2024  
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$110,073.06** CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA  
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

**ATENTAMENTE**

GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.

**RECIBE**

**CONTROL PRESUPUESTAL**

## RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: FAISMUN	CONTRATO No. MC.2317057-057-BIS-LP-2023	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE) TIPO C	\$ 2,126,892.16 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 11 ENERO AL 27 DE ENERO 2024	
LOCALIDAD CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 110,073.06 CON IVA
CONTRATISTA: GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,016,818.01 CON IVA
RFC GVA-201014-9V3 y CCC-221123-JA0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,126,891.07 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>		
<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 94,890.57	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA)	\$ 94,890.57	

--

DESCUENTOS		
0.1% C.I.C.A.C.	\$	94.89
0.2% SIS. DES. INT. FAM. MUN. CUAU.	\$	189.78
SUMA DESCUENTOS	\$	284.67
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	94,890.57
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	94,890.57
I.V.A.	\$	15,182.49
TOTAL	\$	110,073.06
(CON LETRA)		
(CIENTO DIEZ MIL SETENTA Y TRES PESOS 6/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	284.67
SALDO NETO A RECIBIR	\$	109,788.39

AUTORIZO	ELABORO
	
ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA RESIDENTE D.O.P.	GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V. CONTRATISTA
REVISÓ	Vo. Bo.
	
Ing. Claudia de la Vega Jefe de Planeación	ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY Director de Obras Publicas Municipales

CHIHUAHUA, CHIH., 27 DE ENERO DEL 2024

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, LA CANTIDAD DE: \$ 109,788.39  
(CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.) COMO PAGO A LA  
ESTIMACIÓN NUM. 7 (SIETE) TIPO (CONTRATO No. MC.231) POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,126,892.16 INCLUYE CONVENIO  
0.00 POR TRABAJOS EN LA OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	94,890.57
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	94,890.57
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		\$	15,182.49
C.I.C.A.C. DEL 0.1%	94.89		
SIS. DES. INT. FAM. MUN. CUAU. DEL 0.2%	189.78		
	SUMA		284.67

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA


<b>1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)</b>	<b>CONTRATO</b>
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,918,793.32
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 208,098.84
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 2,016,818.01
ESTA ESTIMACION	\$ 110,073.06
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 2,126,891.07
POR EJERCER	\$ 1.09

<b>2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)</b>	<b>CONTRATO</b>
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 575,638.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 575,638.00
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 575,638.00
POR AMORTIZAR	\$ -

<b>3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO</b>	<b>0.1% C.I.C.A.C. 0.2% SIS. DES. INT. FAM. MUN. CUAU</b>
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,738.61 \$ 3,477.24
ESTA ESTIMACION	\$ 94.89 \$ 189.78
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,833.50 \$ 3,667.02

RECIBIMOS





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

LOCALIDAD CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHU.No. CONTRATO: MC.2317057-057-BIS-LP-202;

ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE) TIPO C

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. PERÍODO: 11 ENERO AL 27 DE ENERO 2024  
N.C.C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

**OBRA EXTRAORDINARIA**  
EXTRAORDINARIA

1		94,890.57
---	--	-----------

SUBTOTAL	94,890.57
I.V.A.	15,182.49
TOTAL	110,073.06

POR EL CONTRATISTA:  
ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS

SUPERVISIÓN D.O.P.  
ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

LOCALIDAD CD. CUAUHTÉMOC.  
Io. CONTRATO: MC.2317057-057-BIS-LP-2023

ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE) TIPO C

CONTRATISTA: GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  
CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.

PERIODO: 11 ENERO AL 27 DE ENERO 2024

No.		CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO		IMPORTE		
		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO			
<b><u>OBRA EXTRAORDINARIA</u></b>												
1	EXTRAORDINARIA											
EXT-01	Piso de cerámica línea Satori Crema de 40.0 X 40.0 cms. marca Inter ceramic, boquilla de 4.00 mm, colocado con adhesivos y boquilla marca Inter ceramic o similar, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m2	336.00	90.68	-	90.68	\$	447.58	\$	94,890.57	40,586.55	
EXT-02	Placa entrega de lamina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	21.00	21.00	-	21.00	\$	883.38	\$	18,550.98		
EXT-03	Demolicion de concreto armado en losa de 4 x 4 m, Incluye: demolicion a mano, carga de material producto de demolicion a mano, acarreo por interiores con botes a mano, retiro de material producto de demolición a banco de desperdicios y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m2	32.00	36.00	-	36.00	\$	993.14	\$	35,753.04		
										SUMA	\$	94,890.57
										IVA	\$	15,182.49
										TOTAL	\$	110,073.06

POR EL CONTRATISTA:  
ING. CARLOS ESCÁRREGA RAMOS

SUPERVISIÓN D.O.P.:  
ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA




**GENERADOR DE VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.			NO. DE ESTIMACION ' (SIETE) TIPO C					
			PERIODO: 11 ENERO AL 27 DE ENERO 2024					
LOCALIDAD: CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.			FECHA: 27 DE ENERO DEL 2024					
CCNTRATISTA: GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES		VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	ANCHO	
EXT-01	Piso de cerámica línea Satori Crema de 40.0 X 40.0 cms. marca Interkeramic, boquilla de 4.00 mm, colocado con adhesivos y boquilla marca Interkeramic o similar, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m2	cuarto 9			4.20	3.20	13.44
			cuarto 12			4.20	3.20	13.44
			cuarto 14			4.20	3.20	13.44
			cuarto 15			4.20	3.20	13.44
			cuarto 3			4.20	3.20	13.44
			cuarto 11			4.20	3.20	13.44
			cuarto 13			4.20	1.915	8.04
			cuarto 9	escalones		2.00	1.00	2.00
						-	-	-
						-	-	-
T O T A L								90.68

POR EL CONTRATISTA:  
ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS


SUPERVISIÓN D.O.P.  
ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA





**GENERADOR DE VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.									
NO. DE ESTIMACION (SIETE) TIPO C									
PERIODO: 11 ENERO AL 27 DE ENERO 2024									
FECHA: 27 DE ENERO DEL 2024									
CONTRATISTA: GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C									
LOCALIDAD: CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	ENTRE EJES	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
EXT-02	Placa entrega de lamina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	cuarto 1		1				1.00
			cuarto 2		1				1.00
			cuarto 3		1				1.00
			cuarto 4		1				1.00
			cuarto 5		1				1.00
			cuarto 6		1				1.00
			cuarto 7		1				1.00
			cuarto 8		1				1.00
			cuarto 9		1				1.00
			cuarto 10		1				1.00
			cuarto 11		1				1.00
			cuarto 12		1				1.00
			cuarto 13		1				1.00
			cuarto 14		1				1.00
			cuarto 15		1				1.00
			cuarto 16		1				1.00
			cuarto 17		1				1.00
			cuarto 18		1				1.00
			cuarto 19		1				1.00
			cuarto 20		1				1.00
			cuarto 21		1				1.00
						T O T A L			21.00
EXT-03	Demolicion de concreto armado en losa de 4 x 4 m, Incluye: demolicion a mano, carga de material producto de demolicion a mano, acarreo por interiores con botes a mano, retiro de material producto de demolición a banco de desperdicios y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m2	cuarto 2			4.00	4.50		18.00
			cuarto 1			4.00	4.50		18.00
						T O T A L			36.00




## CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS DE OBRA

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.  
**CONTRATO:** MC.2317057-057-BIS-LP-2023  
**ESTIMACIÓN:** 7 (SIETE) TIPO C


<b>CLAVE:</b>	<b>CONCEPTO:</b>	<b>UNIDAD</b>
EXT-01	Piso de cerámica linea Satori Cremade 40.0 X 40.0 cms. marcalinterceramic, boquilla de 4.00 mm, colocado con adhesivos y boquillamarca Inte	m2

### CROQUIS DE OBRA :

cuarto 9

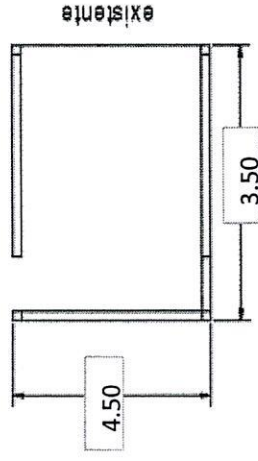


cuarto 12

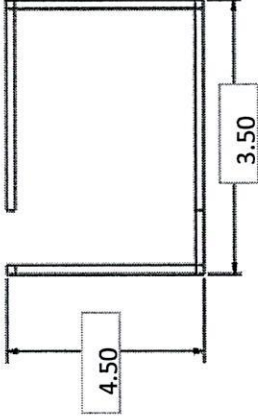


cuarto 14

existente

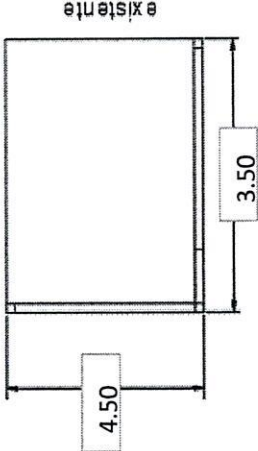


cuarto 15


existente

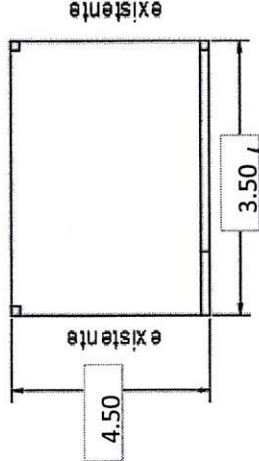

cuarto 3

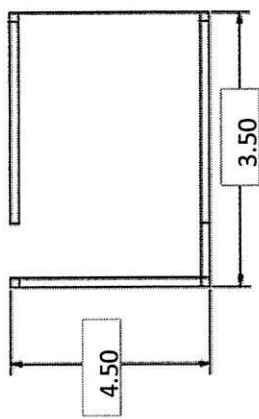

cuarto 11

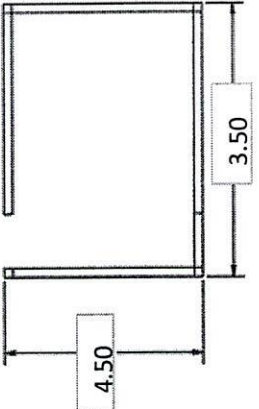


ELABORÓ:

REVISÓ:

ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS

ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA






## CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. CONTRATO: MC.2317057-057-BIS-LP- ESTIMACIÓN: 7 (SIETE) TIPO C

CLAVE:	CONCEPTO:	UNIDAD
EXT-02	Placa entrega de lamina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su con	pza

CROQUIS DE OBRA :

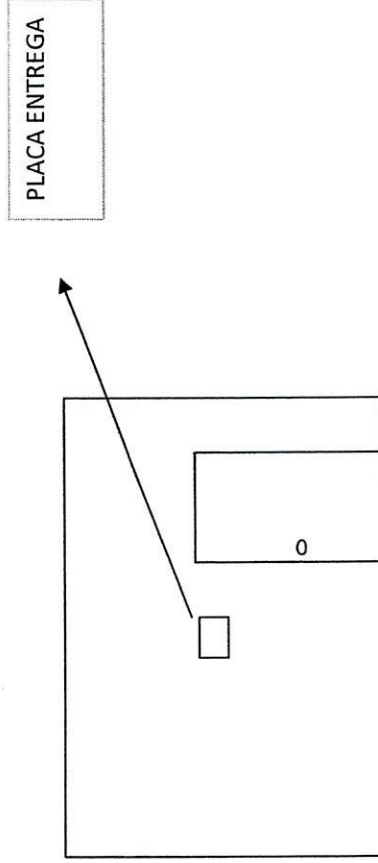

FOTOGRAFÍAS:

ELABORO:

ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS

REVISO:

ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA








## CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS DE OBRA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.      CONTRATO: MC.2317057-057-BIS-LP-2023      ESTIMACIÓN: 7 (SIETE) TIPO C

CLAVE:	CONCEPTO:	UNIDAD
EXT-03	Demolicion de concreto armado enlosa de 4 x 4 m, Incluye: demolicion amano, carga de material producto dedemolicion a mano, acarreo porfi	M2

**CROQUIS DE OBRA :**

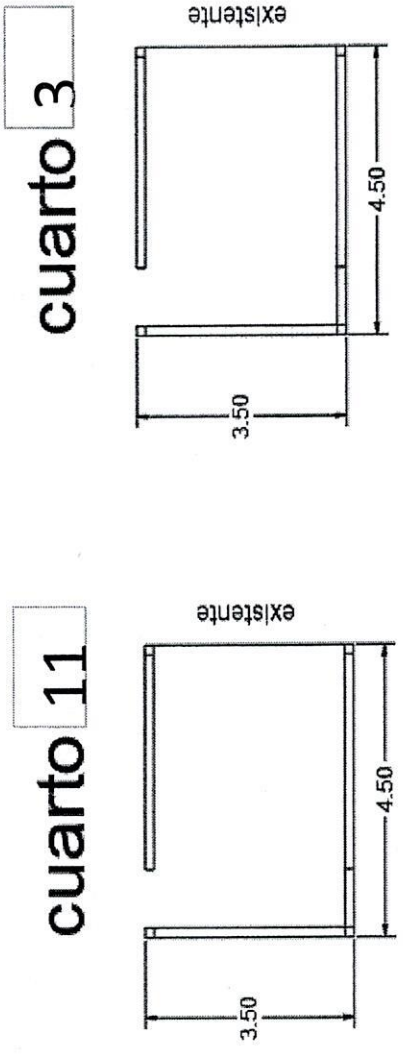

ELABORÓ:   ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS	REVISÓ:   ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA	
--	--	--



## FOTOGRAFÍAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	CONTRATO: MC.2317057-057-BIS-LP-2023	ESTIMACIÓN: 7 (SIETE) TIPO C
<div data-bbox="399 1480 670 1869"></div> <div data-bbox="391 1029 662 1428"></div> <div data-bbox="391 609 662 997"></div> <div data-bbox="694 1470 965 1858"></div> <div data-bbox="686 1008 957 1396"></div> <div data-bbox="686 556 957 945"></div> <div data-bbox="997 1354 1268 1858"></div>		
ELABORÓ: ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS	REVISÓ: ING. RENÉ ALBERTO CHÁVEZ MENDOZA	



Cuauhtémoc, Chih., 20 de Diciembre del 2023

Dirección de Obras Públicas  
Departamento de Proyectos  
Costos y Presupuestos  
No. de Oficio DOP-DP-OC-398/23

ING. CARLOS ESCÁRCEGA RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL

Asunto: Autorización de Precios Extraordinarios


Con relación a su escrito s/n de fecha 20 de Diciembre del 2023, relativo a la obra consistente en la "CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.", según contrato de obra No. MC-2317057-057-BIS-LP-2023.

Nos permitimos informarles que después de haberse efectuado la revisión técnica correspondiente a los precios unitarios solicitados fuera de catalogo, se anexa al presente relación de los mismos debidamente aprobados.


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
EXT-01	Piso de cerámica lineal Santori Crema de 40.0 x 40.0 cms. Marca Inter ceramic, boquilla de 4.00mm, colocado con adhesivos y boquilla marca Inter ceramic o similar, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m2	336.00	\$ 447.58	\$ 150,386.88
EXT-02	Placa entrega de lámina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	21.00	\$ 883.38	\$ 18,550.98
EXT-03	Demolición de concreto armado en losa de 4.00 x 4.00m, incluye: demolición a mano, carga de material producto de demolición a mano, acarreo por interiores con botes a mano, retiro de material producto de demolición a banco de desperdicios y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m2	32.00	\$ 993.14	\$ 31,780.48

NOTA: LOS PRECIOS NO AUTORIZADOS SON POR FALTA DE SOPORTE Y/O JUSTIFICACIÓN

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

 22/Dic/23  
Ing. Gustavo Moreno

REVISÓ  
  
ARQ. RICARDO MARTÍNEZ ROJAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

AUTORIZO  
  
ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

c.c.p. Construcción  
agto

2023. CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA  
2023. CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA
