




**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
A 24 DE AGOSTO DE 2023
DOPM 503/2023**

**ING. ALONDRA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.:**

Por medio de la presente le solicito con respecto al contrato de obra No. **MC-2317039-039-LP-2023**, referente "PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH"., suministrar el material del concepto 1.2.2. Suministro de matacan de 2" a 8", espesor de 30 cms, libre de partículas finas, en apego a lo solicitado en concepto. Los días 15 y 17 de Agosto del año en curso se hizo en campo la observación sobre el material suministrado con contenido de roca de dimensiones mayores a 20" (se anexa fotografía de referencia), observando también la presencia de finos (fotografía de evidencia). Es de gran importancia contar en esta capa rompedora de capilaridad con agregados uniformes que permitan el acomodo, que no se invada en el exceso de tamaño a la estructura de terracería propuesta por laboratorio. Se informa que el pago del concepto en cuestión se aprobará únicamente cuando el material y su tendido sean de acuerdo a lo solicitado en catálogo y a conformidad de la supervisión y el laboratorio de calidad. Se anexa a este oficio copia de los informes de laboratorio haciendo la observación anteriormente citada, y se solicita a la contratista tomar a la brevedad medidas para la correcta ejecución de este concepto de obra.

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE



ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MÁRQUEZ
RESIDENTE D.O.P.


Recibí
28/AGO/23


Ing. Alondra R.

c.p.p. cronológico



PARTÍCULAS CON TAMAÑO MAYOR DE 20"

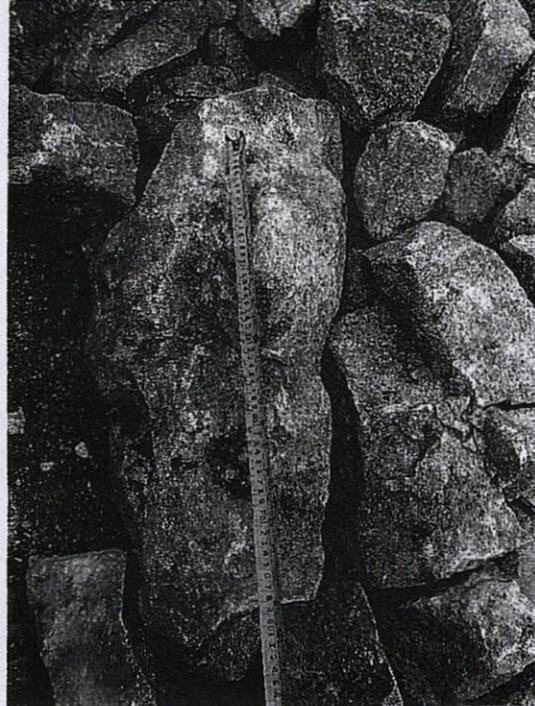

TENDIDO DE PIEDRAPLEN CON PRESENCIA DE FINOS



Handwritten signature
